

SUMAR PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU REALIZAREA SRSJ
RAPORT SEMESTRIAL IANUARIE 2014 - IULIE 2014
PILONUL VII

STATISTICĂ GENERALĂ SRSJ


Total acțiuni	Realizate	Realizate parțial	Nerealizate	Desuete sau irelevante
42	32	8	2	0
100%	76%	19%	5%	-

Graficul de mai jos reflectă nivelul de implementare a Pilonului respectiv conform Strategiei și Planului de Acțiuni la data indicată în axa orizontală. Astfel, codul numeric "1409" presupune: primele două cifre "14" - anul 2014, ultimele două cifre "09" - luna septembrie.

Fonul albastru reflectă volumul de lucru (din totalul pe Pilonul respectiv pînă la finele Strategiei și Planului de Acțiuni - 2016) programat pentru etapa respectivă (i.e. septembrie 2014).

Coloanele de culoare galbenă indică cota realizată la data respectivă.

Precizăm că volumul de lucru pentru Pilon a fost calculat în dependență de următoarele criterii: numărul de acțiuni în Pilon, numărul de indicatori ai acestor acțiuni, ponderea direcțiilor strategice/domeniilor de intervenție/acțiunilor/indicatorilor după cum au fost stabilite de către Grupul de lucru.

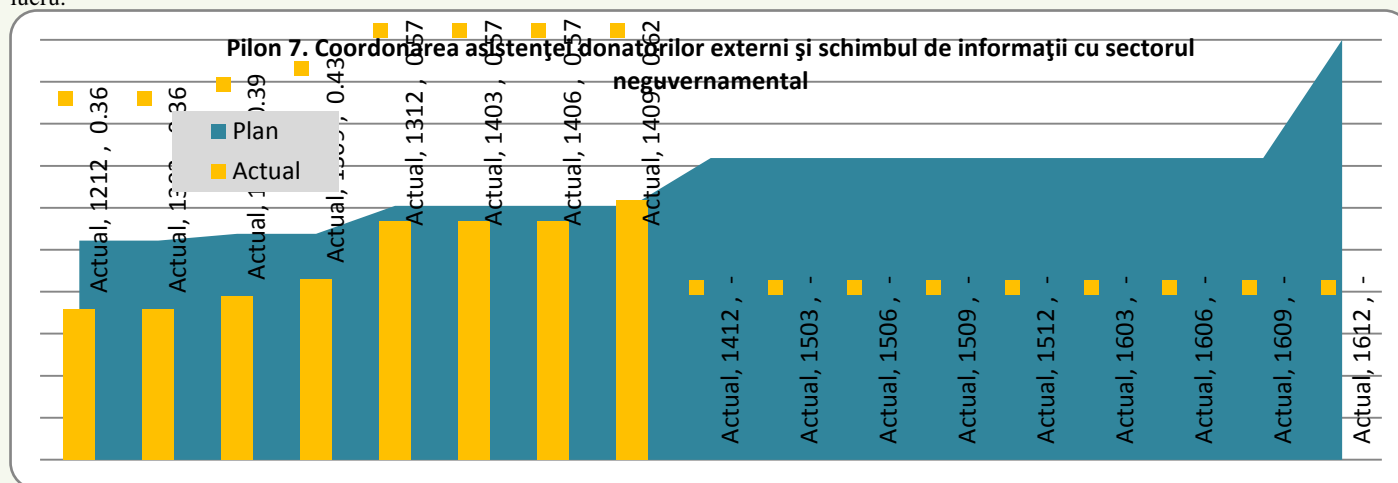

Performanța instituțiilor

Tabelul de mai jos reflectă performanța instituțiilor raportată la volumul de lucru integral prevăzut în Pilonul VII conform Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei pînă la finele acesteia (2016). Volumul de lucru total în Pilonul respectiv pentru toate instituțiile reprezintă 1,00, iar fiecărei instituții îi revine o cotă din acest total (de ex. Ministerului Justiției îi revine cea mai mare parte, care constituie cota 0,69 din 1,00). Drept criteriu pentru aprecierea respectivă a fost luată responsabilitatea implementării și raportării repartizate instituțiilor (primul loc ocupat în lista instituțiilor implementatoare la acțiunea respectivă). La fel, este de menționat că cota parte a volumului de lucru pentru instituție a fost calculată în dependență de următoarele criterii: numărul de acțiuni de care e responsabilă instituția, numărul de indicatori ai acestor acțiuni, ponderea direcțiilor strategice/domeniilor de intervenție/acțiunilor/indicatorilor după cum au fost stabilite de către Grupul de lucru.

Rîndul "Ponderabilitatea indicatorilor realizați (din max. 1,00)" reflectă cota implementată din volumul de muncă total (în Pilonul respectiv) repartizat instituției.

Rîndul "Ponderabilitatea indicatorilor realizați în raport cu volumul de lucru (%)" reflectă coraportul procentual dintre cota implementată și volumul de muncă total (în Pilonul respectiv) repartizat instituției. De ex. Ministerul Justiției a implementat 0,53 din cota 0,69 atribuită în Pilonul respectiv conform Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei pînă la finele acesteia (2016), ceea ce reprezintă 77%.

	MJ	CNROND	MAI	MED	DIVERSE
Volumul de lucru (ponderat) în cadrul acestui pilon (din max. 1,00)	0,69	0,06	0,02	0,13	0,09
Ponderabilitatea indicatorilor realizați (din max. 1,00)	0,53	0,04	-	0,02	0,03
Ponderabilitatea indicatorilor realizați în raport cu volumul de lucru(%)	77	67	-	14	29

REALIZĂRI IMPORTANTE / IMPACT

- **Realizarea manualului privind elaborarea actelor normative** (7.2.2. p. 4). A fost constituit un grup de lucru inter-instituțional care va elabora manualul actelor normative. În cadrul ședințelor din 27 și 31 mai 2014 a fost elaborat conceptul și structural conținutul manualului. Grupul de lucru a fost asistat de către doi experți (local și internațional) din cadrul Proiectului UE privind Susținerea Coordonării Reformei Sectorului Justiției în Republica Moldova.
- **Optimizarea bazei de date a actelor normative** (7.2.3. p. 2). Ministerul Justiției a realizat conceptul de optimizare. Se monitorizează introducerea modificărilor și completărilor în actele normative în varianta electronică, dat fiind faptul că sunt peste 100 mii de acte normative ce urmează a fi mutate de pe serverul vechi pe cel nou. În luna august 2014, Ministerul Justiției a inițiat procesul de versionare a actelor normative și de populare a platformei modificate cu actele versionate, care va oferi posibilitatea cautării în textul actului.
- **Asigurarea unor condiții adecvate de lucru personalului Ministerului Justiției pentru a eficientiza activitatea acestuia** (7.1.3. p. 7). În anul 2014, a avut loc reparația capitală a clădirii apartului central al Ministerului. Conform contractelor încheiate, Ministerul Justiției a beneficiat și de achiziționarea echipamentelor TIC și lucrări de trasare a rețelei transfer date, produse de program.

NEREALIZĂRI / CAUZE:

Elaborarea și implementarea modificărilor structurale și funcționale ale instituțiilor implicate în reforma sectorului justiției în vederea participării active a acestora la procesul de reformă (7.1.4.p. 2). Elaborarea unor modificări structurale și funcționale vor fi efectuate după realizarea analizei funcțiilor și structurii fiecărei instituții conform acțiunii precedente din domeniul de intervenție respectiv.

DIFICULTĂȚI:

Realizarea acțiunilor **Elaborarea cadrului normativ privind metodologia evaluării ex-ante** (7.2.2. p. 3), **Realizarea unui manual privind elaborarea actelor normative** (7.2.2. p. 4) și **Crearea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor normative (de la stadiul de proiect până la cel de act publicat)** (7.2.3. p. 3) este dificilă în condițiile în care cadrul normativ privind procesul de creație legislativă nu a fost modificat. Proiectul de lege privind actele normative se află la Ministerul Justiției pentru definitivare.

Astfel, elaborarea cadrului normativ privind metodologia evaluării ex-ante este condiționată de adoptarea proiectului de lege privind actele normative. Realizarea unui manual privind elaborarea actelor normative în conformitate cu legislația în vigoare ar fi inoportună în condițiile în care aceasta va fi modificată în viitorul apropiat. Implementarea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor normative (de la stadiul de proiect până la cel de act publicat) necesită, pe de o parte, reglementare legislativă prin care s-ar stabili că acest proces să aibă loc pe platforma on-line în cadrul acestui sistem informațional, dar și optimizarea bazei de date a actelor normative în vigoare (acțiunea 7.2.3. p. 2) pe de altă parte.

IMPLICARE PARTENERI / SOCIETATE CIVILĂ

Proiectul Uniunii Europene Suport în Coordonarea Reformei în Domeniul Justiției în Moldova a contribuit la sporirea capacităților instituționale ale Mecanismului de Coordonare și Monitorizare, inclusiv a Secretariatului tehnic, precum și la susținerea coordonării generale a reformării sectorului justiției între toți actorii cheie (instituțiile implementatoare, donatorii, societatea civilă).

ACTIVITATEA GRUPULUI DE LUCRU

În semestrul I 2014, Grupul de lucru pentru Pilonul VII a desfășurat 3 ședințe.

RECOMANDĂRI ALE GRUPULUI DE LUCRU

1. **Grupul de lucru pentru Pilonul VII** ia act de totalitatea dificultăților și recomandărilor raportate de Grupurile de lucru pentru Pilonii I-VI.
2. Cu privire la dificultatea raportată în cadrul Grupului de lucru pentru Pilonul I referitor la realizarea acțiunii **Crearea unui centru de informații juridice accesibil pentru judecători, procurori și reprezentanții altor profesii juridice** (act. 1.3.1. punct 4): Institutul Național al Justiției consideră ca fiind necesară majorarea statului său de personal cu 12 unități de personal administrativ și 2 unități de personal auxiliar. Ministerul Finanțelor susține doar completarea cu 6 unități de personal. Suplimentar, aparent se constată și insuficiența mijloacelor financiare pentru dotarea Centrului. **Grupul de lucru pentru Pilonul VII consideră ca fiind necesară prezentarea acestui subiect pentru consultare Consiliului Național pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept.**
3. **Grupul de lucru pentru Pilonul VII** atenționează membrii tuturor Grupurilor de lucru despre necesitatea prezenței și participării active la ședințele acestora, în vederea asigurării funcționalității Grupurilor de lucru și eficientizării activității de coordonare și monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011–2016.
